| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **ALLESTIMENTO DEL CANTIERE** | 5 g |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 g |
| Realizzazione della viabilità del cantiere | 1 g |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e | 1 g |
| Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere | 1 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 g |
| Realizzazione di impianto idrico del cantiere | 1 g |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 g |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 g |
| **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SCAVI** | 8 g |
| Demolizione generale di muri di recinzione eseguita con impie | 3 g |
| Rimozione di recinzione in rete metallica | 2 g |
| Scavo per ripristini e risanamenti | 2 g |
| Scavo a sezione ristretta | 1 g |
| **SOTTOSERVIZI** | 7 g |
| Posa di conduttura elettrica | 1 g |
| Posa di conduttura idrica | 2 g |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 3 g |
| Rinterro di scavo | 1 g |
| **MURI DI SOSTEGNO E RECINZIONI** | 36 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz | 3 g |
| Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione | 4 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz | 4 g |
| Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione | 4 g |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione | 1 g |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione | 2 g |
| Posa di recinzioni e cancellate | 3 g |
| **PAVIMENTAZIONE STRADALE E PERCORSI PEDONALI** | 38 g |
| Formazione di fondazione stradale | 5 g |
| Realizzazione di marciapiedi | 10 g |
| Posa di pavimenti per esterni | 9 g |
| Stesa di conglomerato bituminoso | 12 g |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 2 g |
| **ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE** | 2 g |
| Formazione di tappeto erboso | 1 g |
| Messa a dimora di piante | 1 g |
| **SMOBILIZZO DEL CANTIERE** | 1 g |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g |

**LEGENDA Zona:**
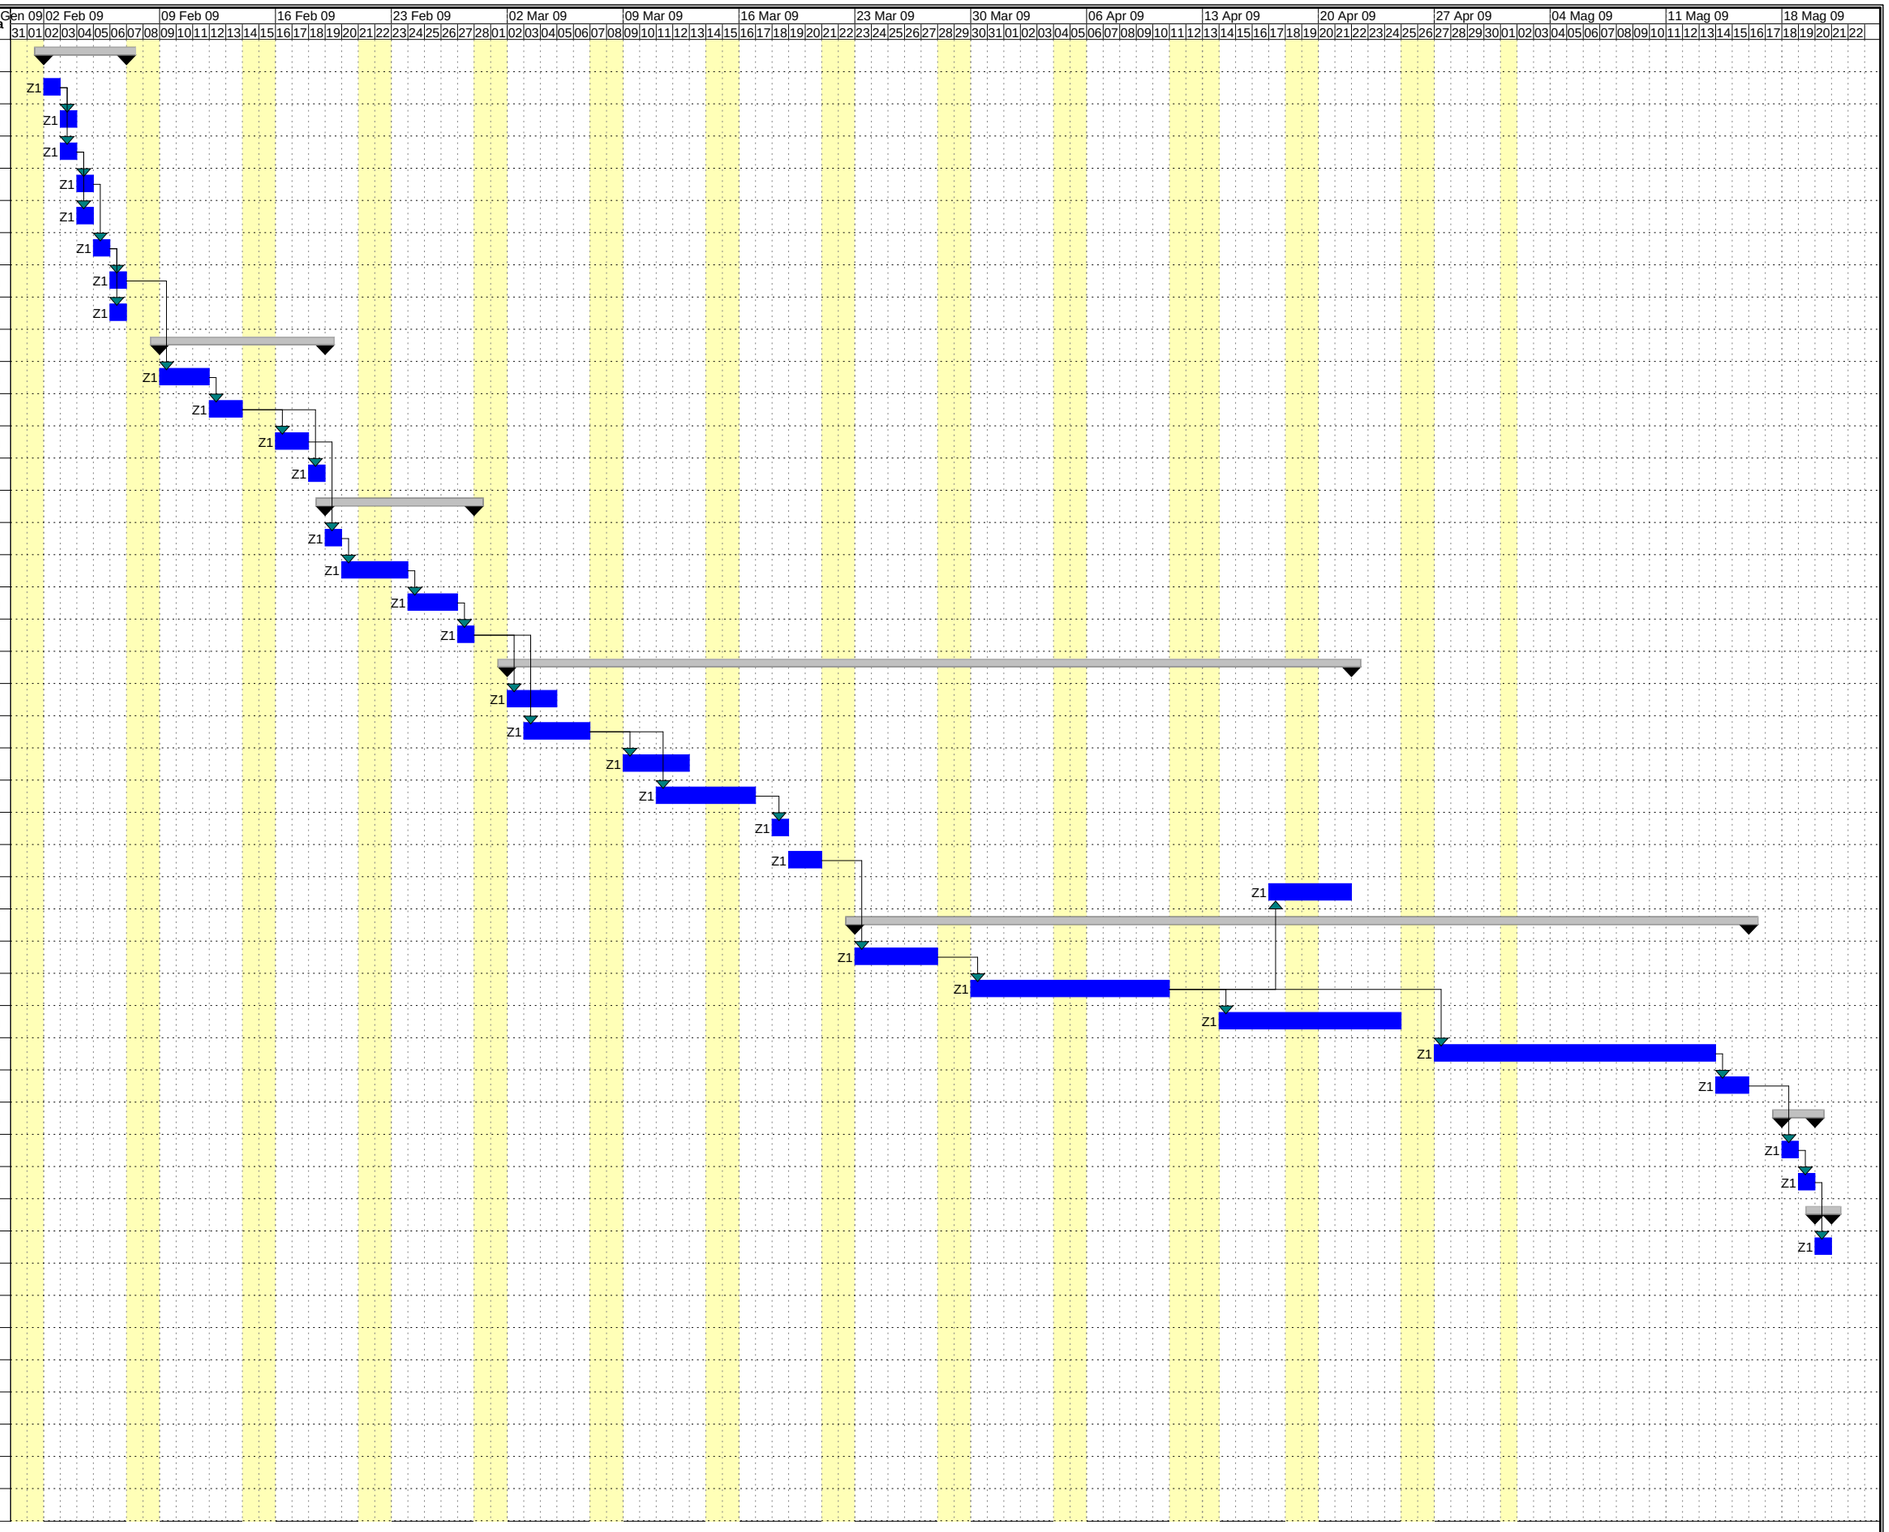
Z1 = ZONA UNICA
