Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	1 g
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
OPERE PROVVISIONALI - PONTEGGIO E GRU	51 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g
Montaggio della gru a torre	1 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g
Smontaggio della gru a torre	1 g
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SCAVI	20 g
Demolizione parziale di muri in pietra - con mezzi meccanici	2 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Rimozione di recinzione in rete metallica	2 g
Rimozione di serramenti interni	1 g
Rimozione di impianti	1 g
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	2 g
Demolizione di pareti divisorie	1 g
Rimozione di pavimenti interni	1 g
Rimozione di massetto	1 g
Rimozione di manto di copertura in lastre di pietra	1 g
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	1 g
Rimozione di serramenti esterni	1 g
Scavo di sbancamento	2 g
Scavo a sezione ristretta	1 g
SOTTOSERVIZI	5 g
Posa di conduttura elettrica	1 g
Posa di conduttura idrica	2 g
Posa di speco fognario prefabbricato	1 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g
Rinterro di scavo	1 g
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE	43 g
RIFACIMENTO COPERTURA	38 g
Realizzazione di cordolo in c.a.	2 g
Posa in opera di orditura in legno	3 g
Impermeabilizzazione di coperture	1 g
Posa di manto di copertura in lastre di pietra	7 g
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g
OPERE INTERNE	17 g
Realizzazione di divisori interni	1 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g
Formazione intonaci interni (industrializzati)	2 g
Posa di pavimenti per interni	1 g
Posa di rivestimenti interni	2 g
Posa di serramenti interni	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	1 g

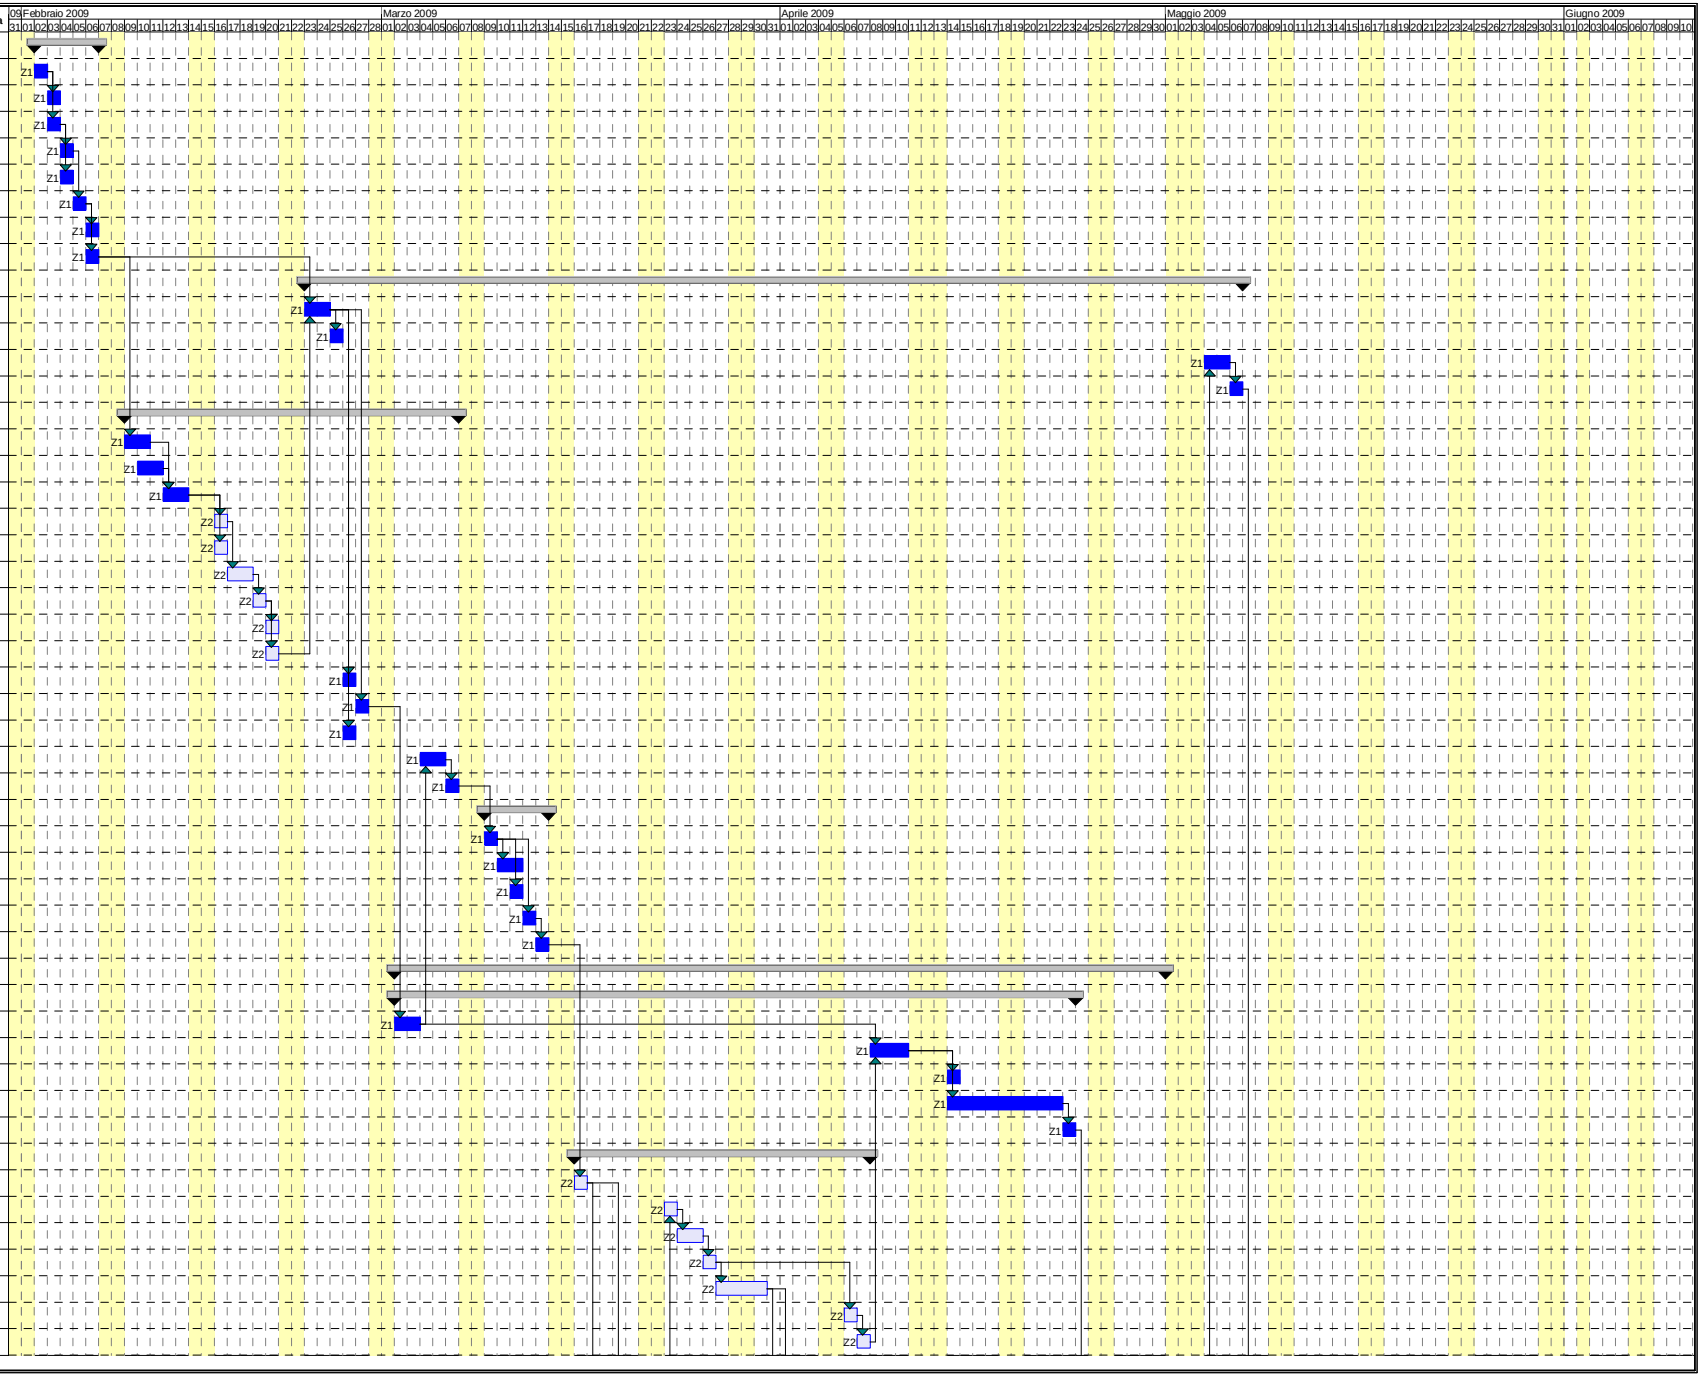

Nome attività	Durata
IMPIANTI	15 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	3 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	6 g
OPERE IN FACCIATA	5 g
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	4 g
Posa di serramenti esterni	1 g
MURI DI SOSTEGNO E RECINZIONI	31 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazior	1 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazion	1 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g
Posa di recinzioni e cancellate	2 g
RIPORTO TERRENO - RILEVATO STRADALE	3 g
Ridefinizione dei piani del terreno	1 g
Formazione di rilevato stradale	1 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Stesa di conglomerato bituminoso	1 g
REALIZZAZIONE PIAZZA COPERTA	36 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazior	1 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g
Montaggio di strutture in acciaio	5 g
Montaggio di copertura in lamiera grecata	3 g
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE	15 g
Realizzazione di marciapiedi	12 g
Formazione di tappeto erboso	1 g
Messa a dimora di piante	1 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	3 g
Smobilizzo del cantiere	3 g

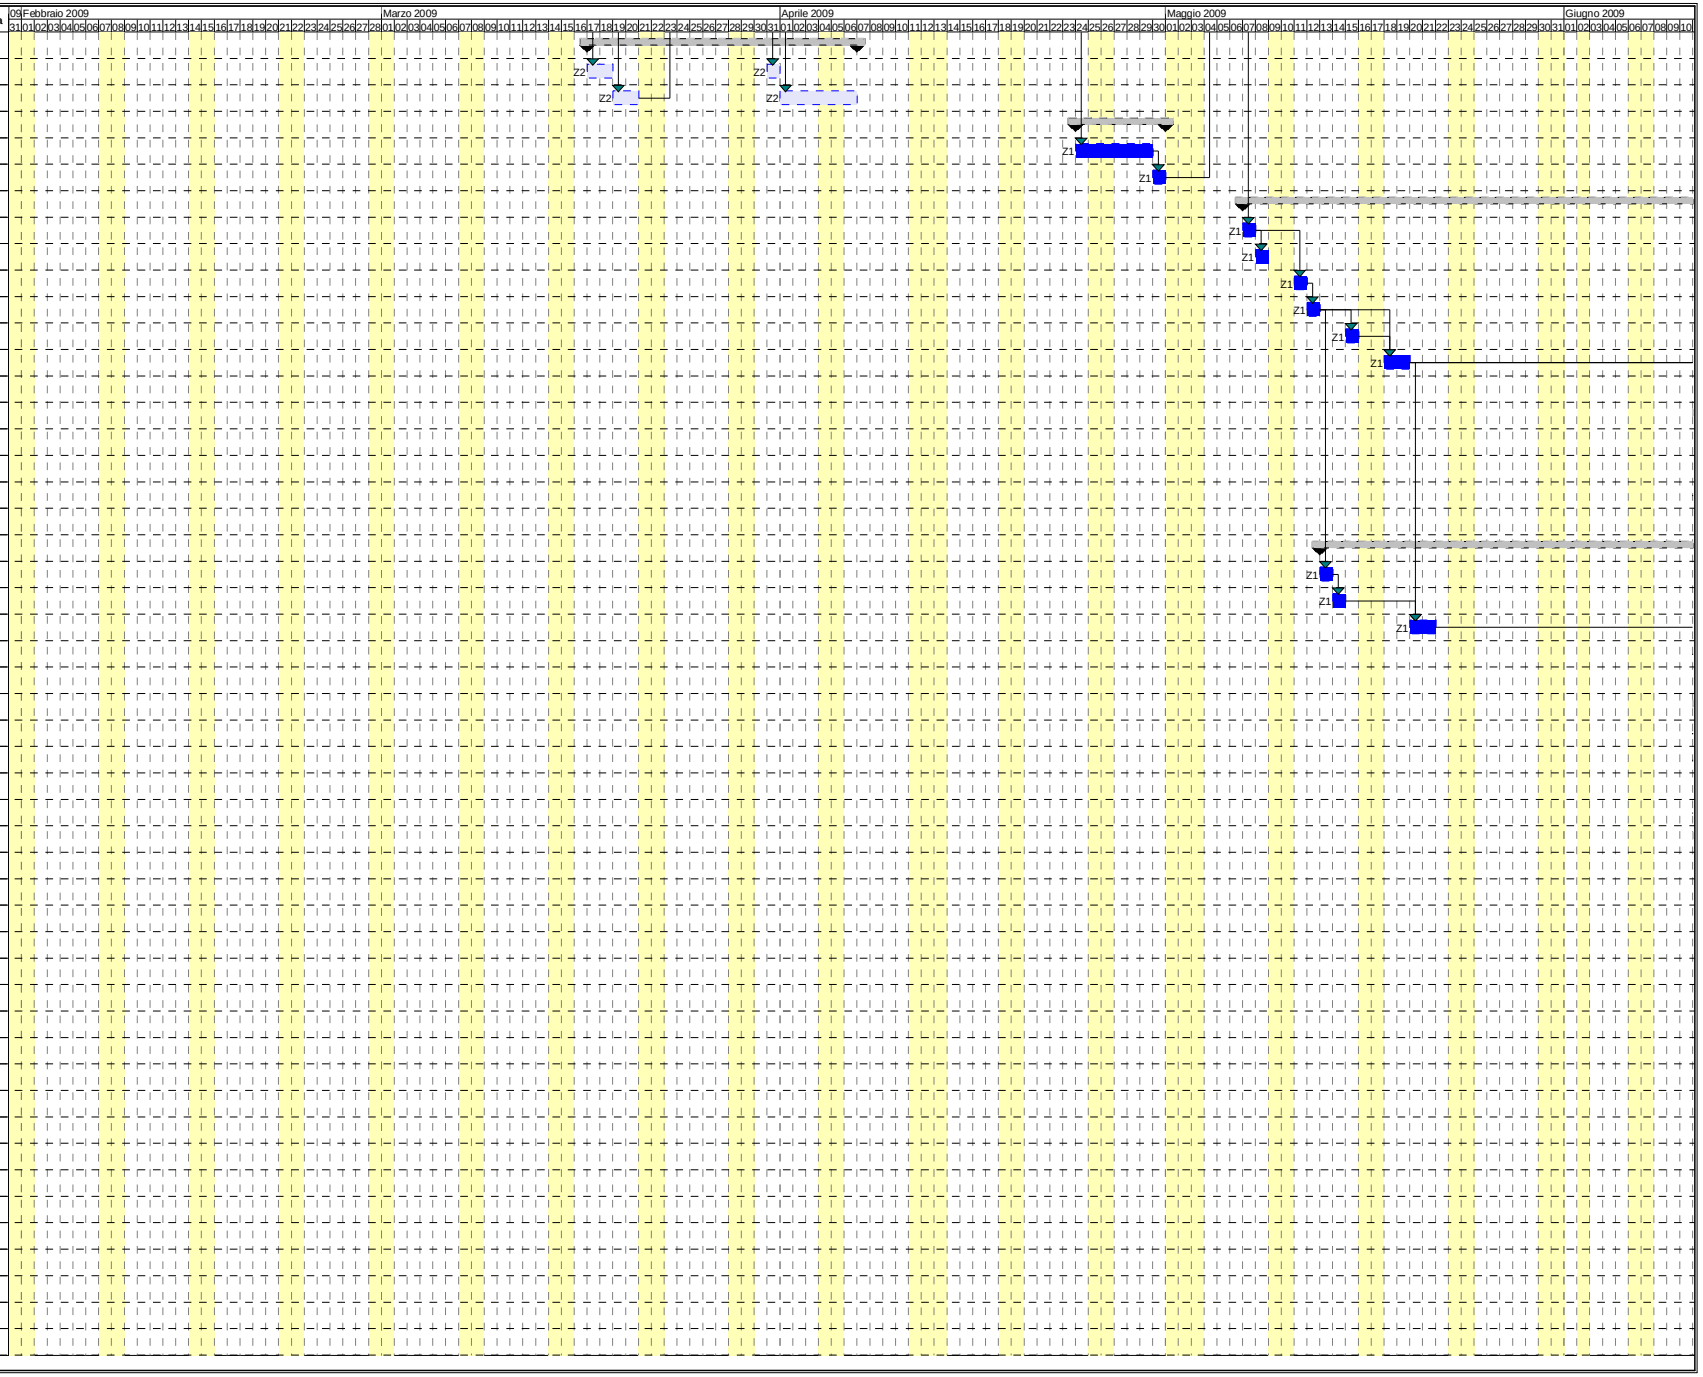

LEGENDA Zona:

Z1 = OPERE ESTERNE

Z2 = OPERE INTERNE

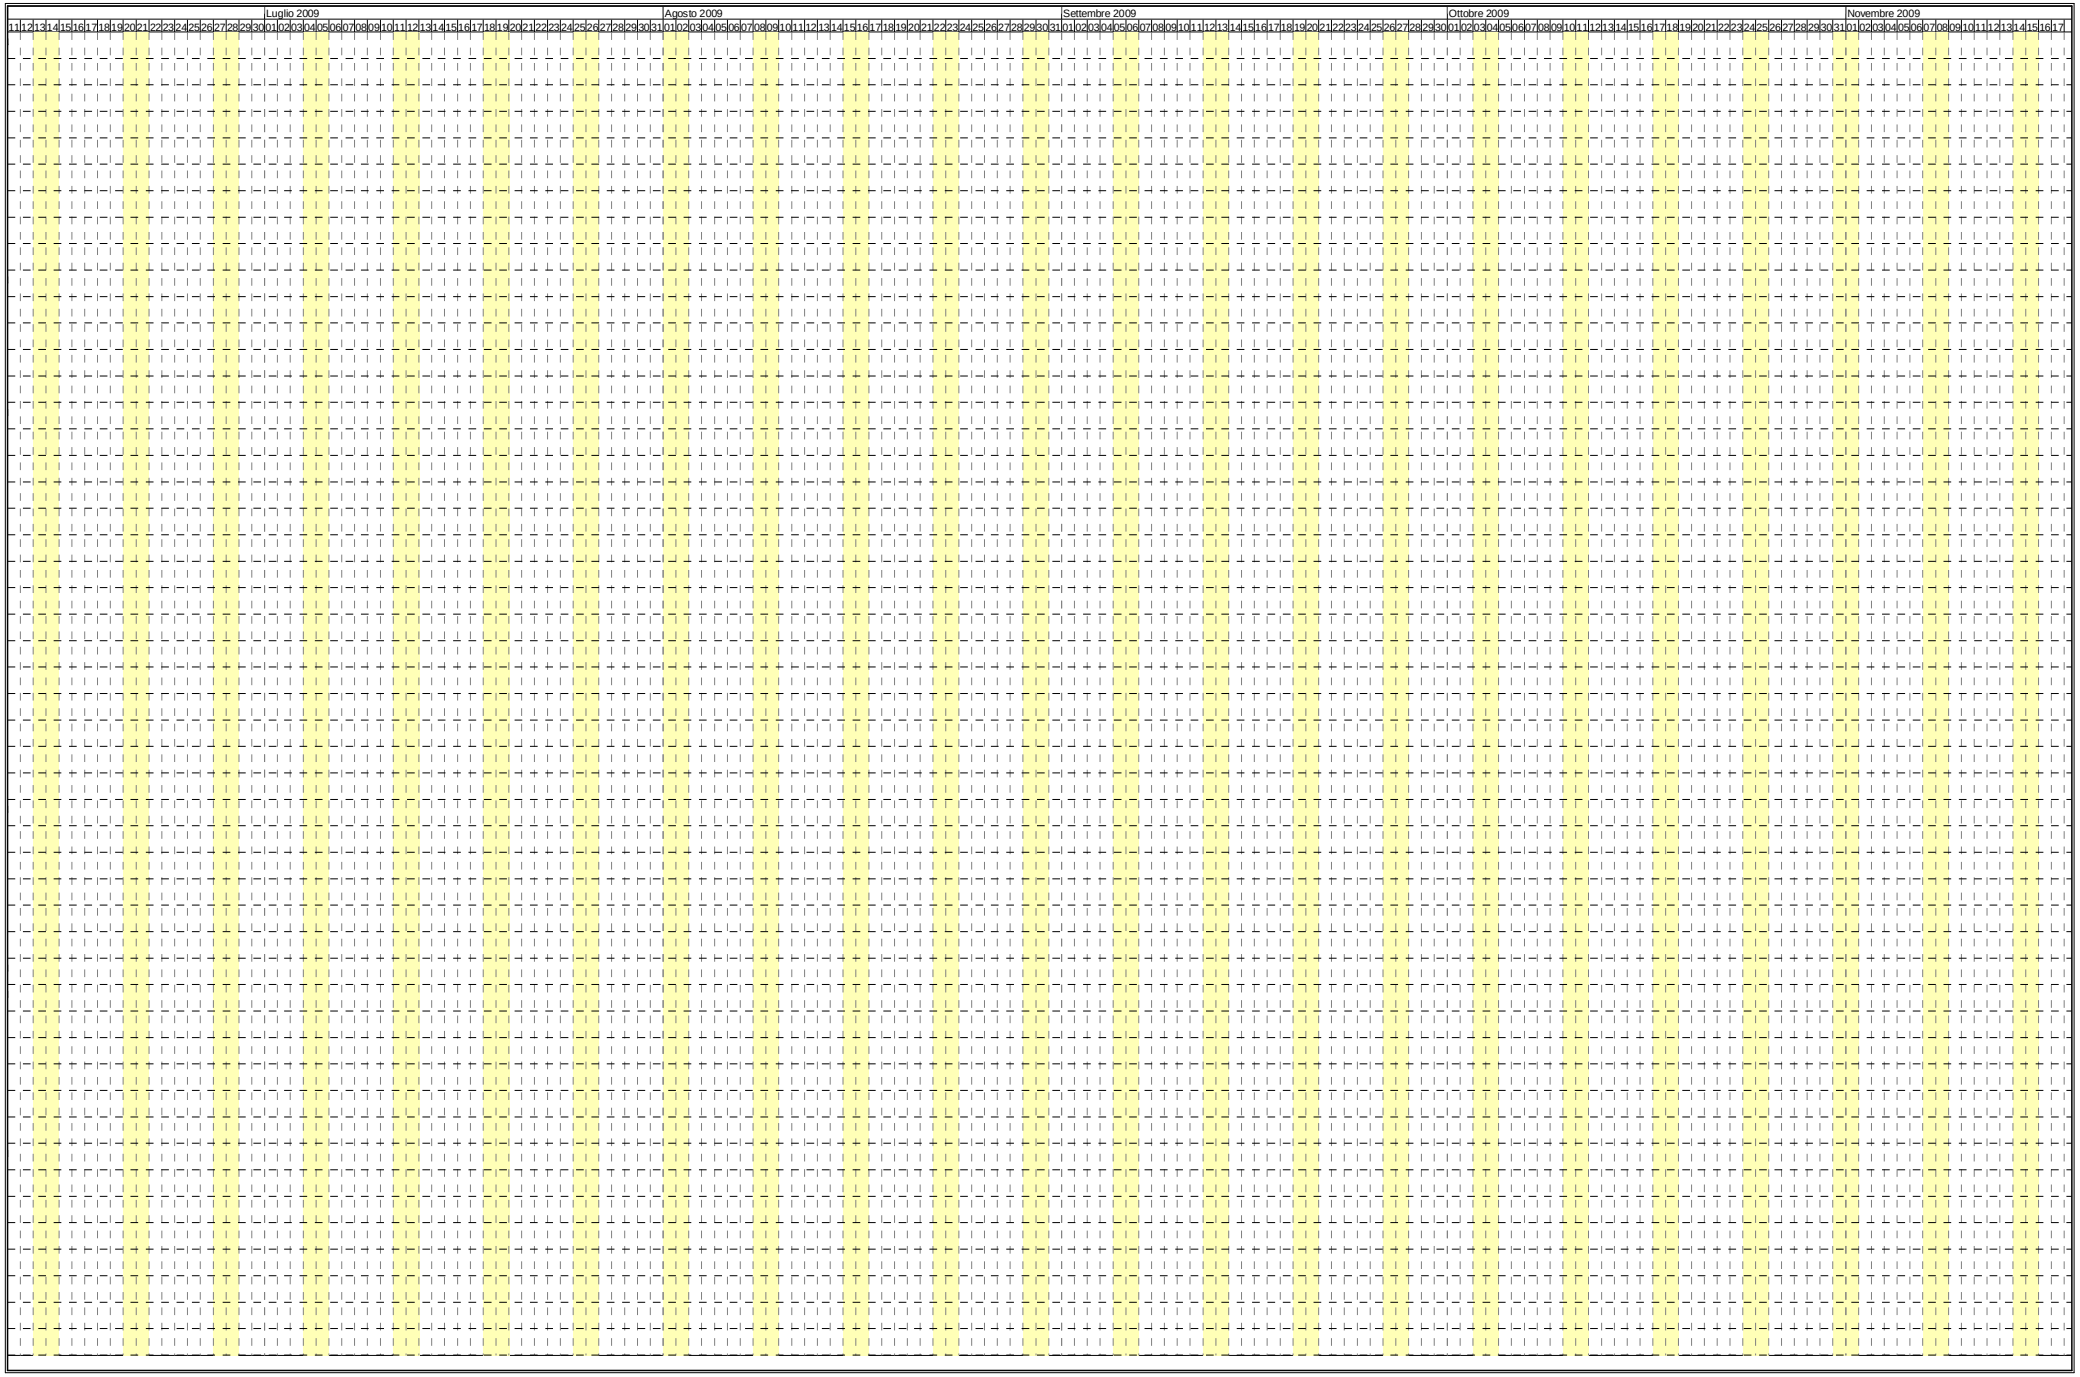
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009

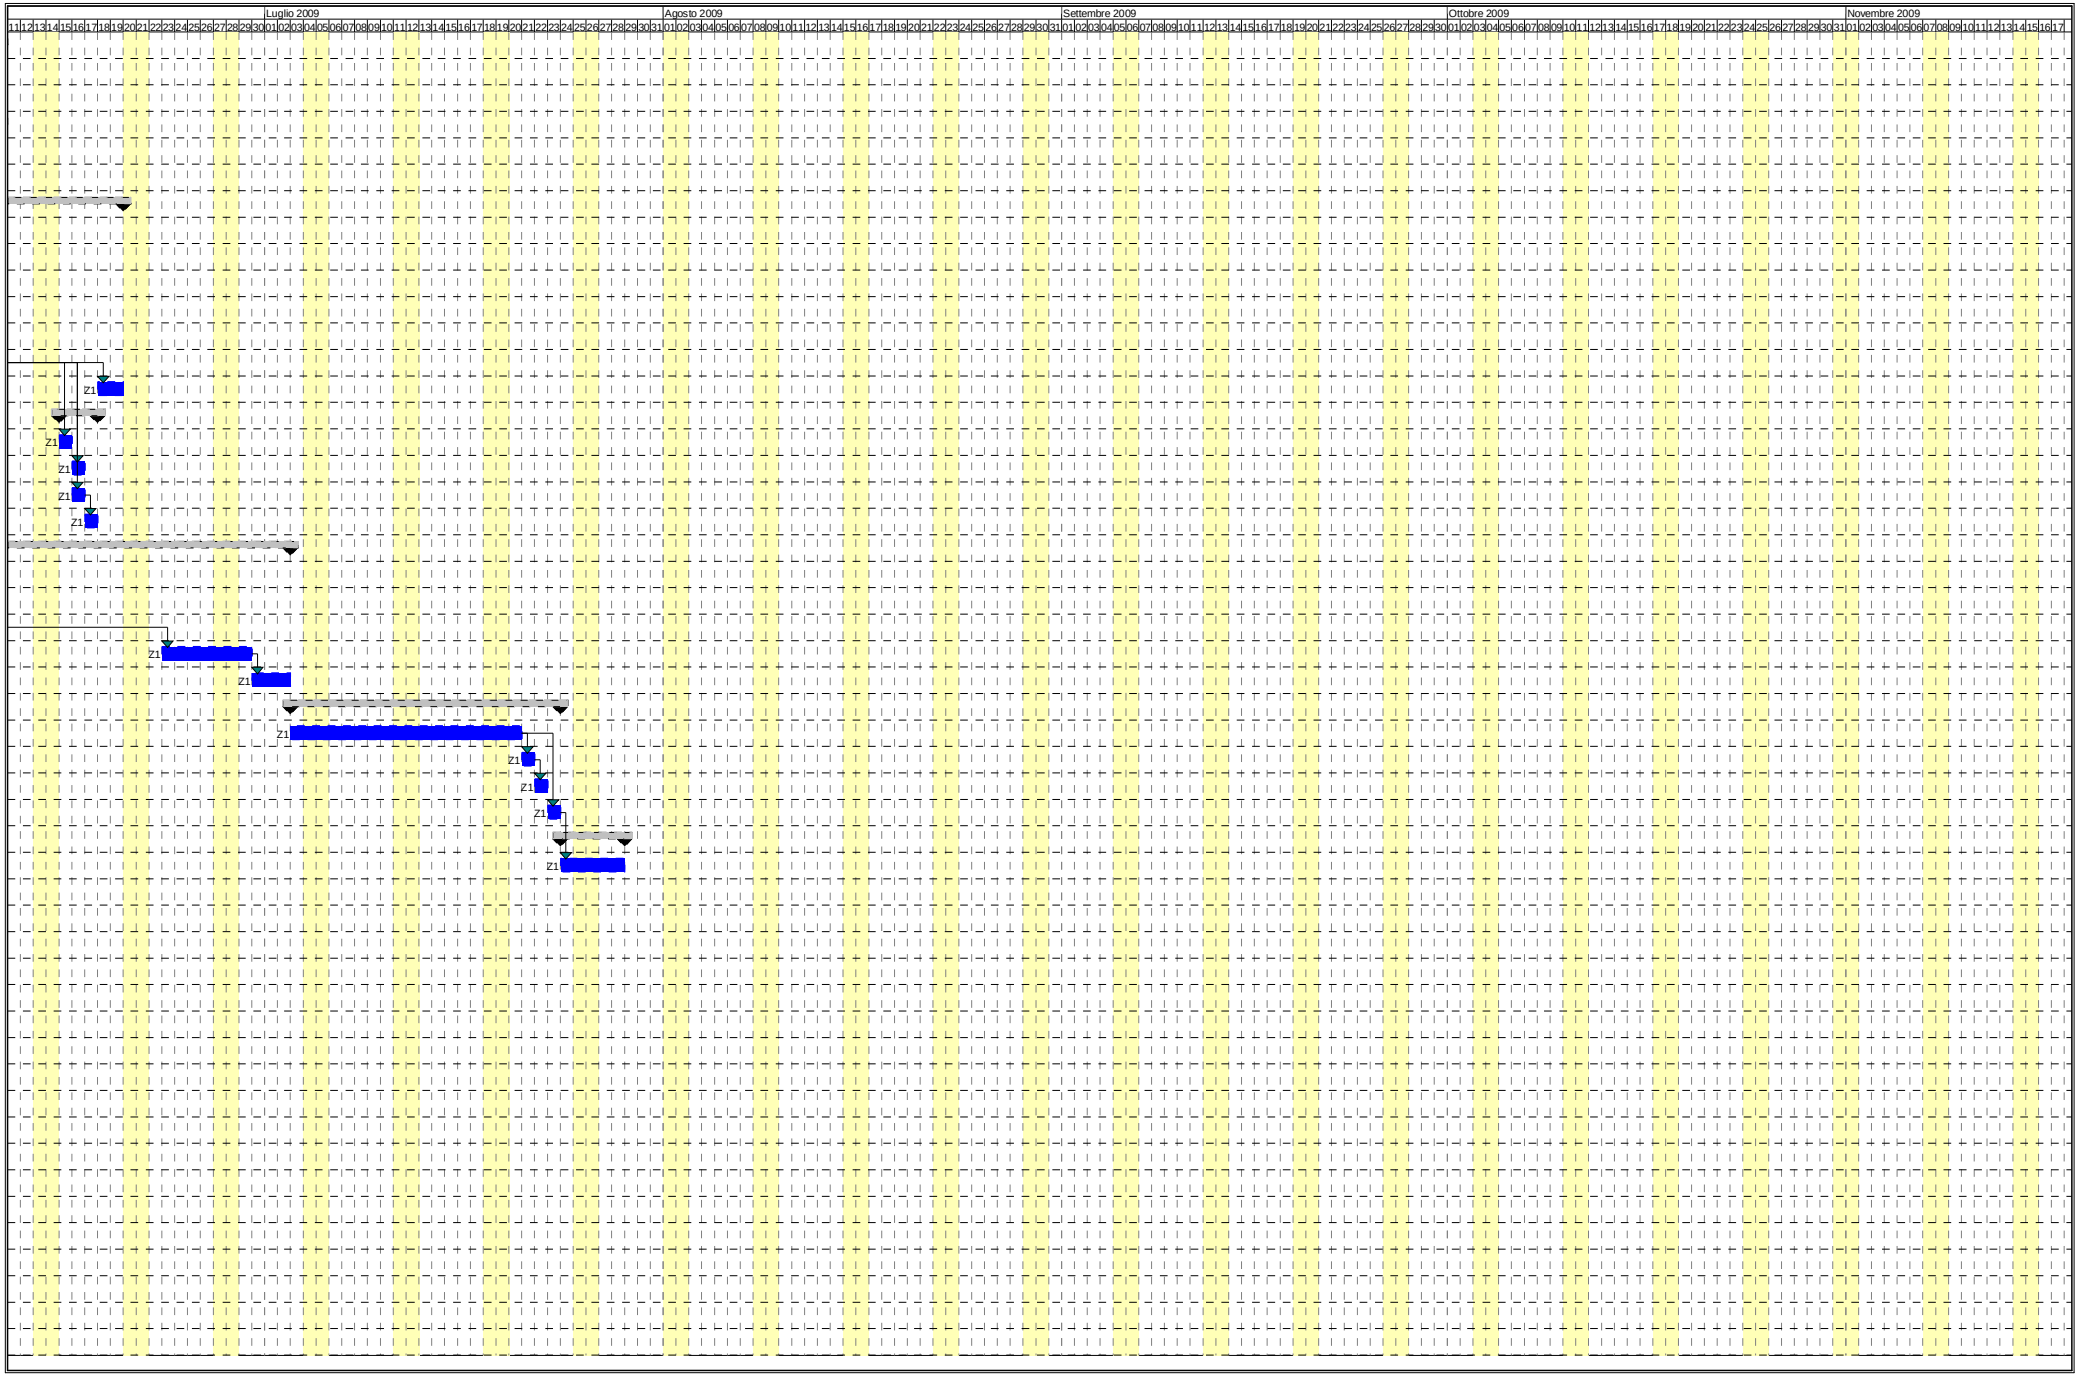
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
